Powstaje szkoła na Grasera

Trwa budowa szkoły podstawowej przy ul. Grasera na osiedlu Jar. Zgodnie z umową placówka ma być gotowa do października 2025 r.

W I etapie powstanie budynek o powierzchni użytkowej 5089 m2. Obiekt posiadać będzie 21 sal lekcyjnych, w tym 4 sale tematyczne, kuchnię ze stołówką, część administracyjną, szatnię i bibliotekę. Szkoła będzie przygotowana do obsługi oddziałów szkolnych, jak również oddziałów przedszkolnych.

Budynek jest wznoszony w technologii tradycyjnej - ściany murowane wzmocnione trzpieniami żelbetowymi, stropy żelbetowe monolityczne. Zastosowano w nim rozwiązania energooszczędne: panele fotowoltaiczne o mocy 49 kWp, oświetlenie typu LED i odzysk ciepła z instalacji wentylacji mechanicznej. Obiekt będzie też w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie obejmuje też zagospodarowanie terenu. Powstanie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, droga dojazdowa i chodniki. W kolejnym etapie placówka może być rozbudowana o kolejne trzy skrzydła: edukacyjne, z salą sportową oraz aulą i mediateką o pow. użytkowej 7 810 m2.

Obecnie zaawansowanie robót wynosi ok. 28 %. Zgodnie z umową wykonawca - firma Balzola ma zrealizować zadanie do października 2025 r. Koszt inwestycji to 36,8 mln zł.

Fot. © UMT 2024, autor: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0

-

-
- 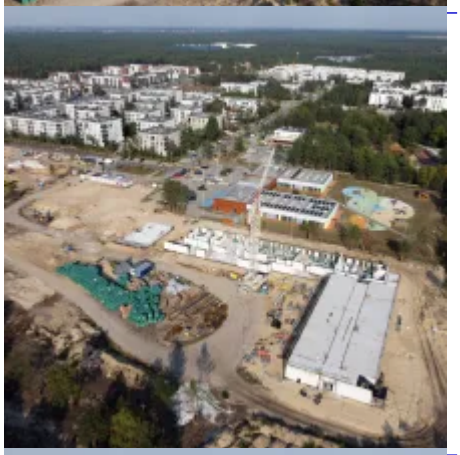
- 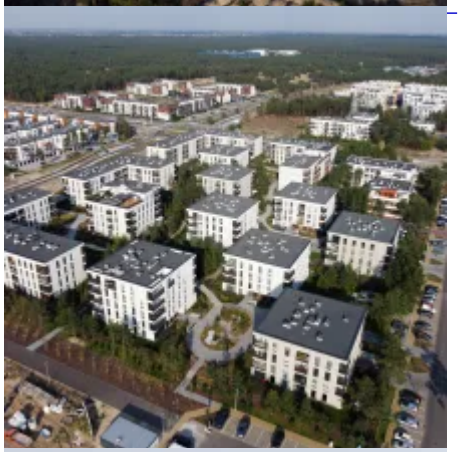
-

-
-
- 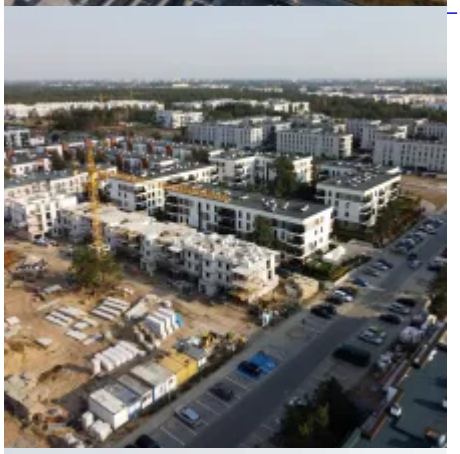
-

-
-
-
-

-
-

- Powrót
- Udostępnij na: X
- Udostępnij na: FB
- Drukuj
- PDF
